


**Report  
Manutenzione  
Pubblica Illuminazione  
mese di aprile 2020**

<b>Tipologia</b>	<b>N.</b>
Interventi U.r.p.	*
Interventi U.r.p. retroattivi	<b>74</b>
Interventi programmati	<b>32</b>
Interventi in emergenza	<b>3</b>
Interventi in reperibilità	<b>3</b>
<b>Totale interventi</b>	<b>112</b>

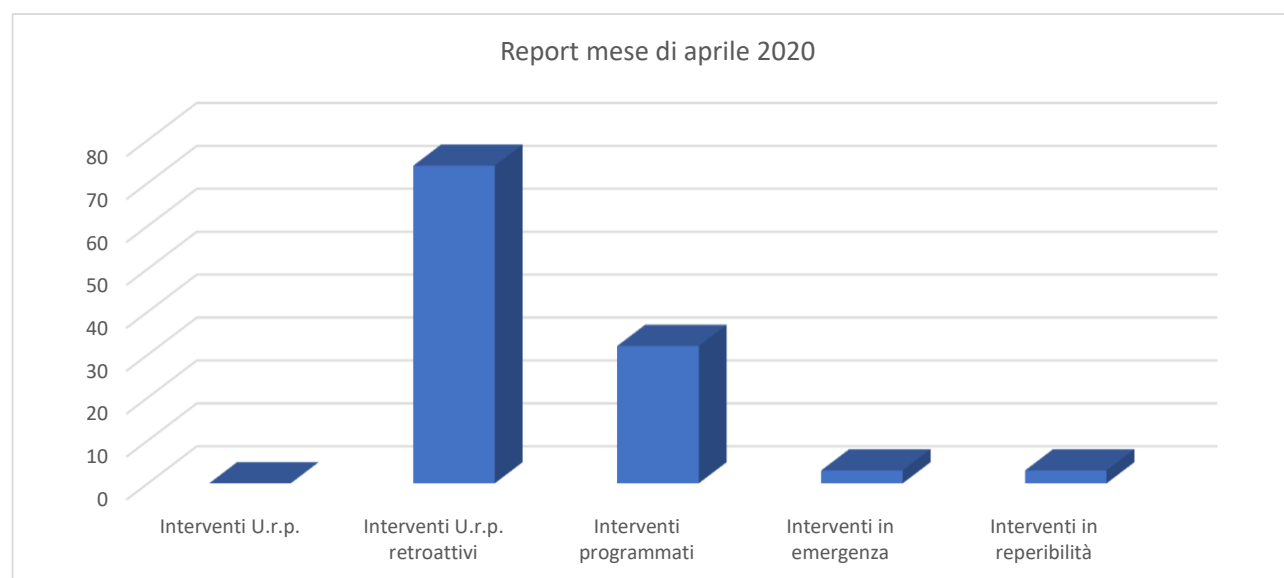

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	131071	02/12/19	Omissis	Via sammito angolo Via Mazzini	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
2	127207	03/12/19	Omissis	Piazza E.S. Carraro	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
3	133924	09/12/19	Omissis	Via Modigliani N. 50	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
4	133924	09/12/19	Omissis	Via Vanvitelli N. 27	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
5	1336924	09/12/19	Omissis	Via Plutarco N. 62	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
6	133924	09/12/19	Omissis	Via Vanvitelli N. 44	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
7	134586	10/12/19	Omissis	Vico Spinello	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
8	134586	10/12/19	Omissis	Via Cairoli N. 14	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
9	134586	10/12/19	Omissis	Via Cairoli N. 14	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
10	134586	10/12/19	Omissis	Via della Soia	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
11	134586	10/12/19	Omissis	Via Cairoli N. 14	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
12	134586	10/12/19	Omissis	Piazza A. Moro N. 1	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
13	135292	11/12/19	Omissis	Via Settefarine angolo Via Indovina	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
14	135292	11/12/19	Omissis	Via Wagner N. 17	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
15	135292	11/12/19	Omissis	Via S. Salvo N. 2	Sostituzione lampada	01/04/20			Intervento già eseguito	
16	896	07/01/20	Omissis	Via Omero N. 18	Sostituzione lampada	01/04/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	100 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	100 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
17	896	30/01/20	Omissis	Via Omero	Sostituzione lampada	01/04/20	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	100 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	100 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
18	136048	12/12/19	Omissis	Via Imola N. 4	Sostituzione lampada	02/04/20	Competenza Enel			
19	136048	12/12/19	Omissis	Via Francia N. 23	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
20	136597	13/12/19	Omissis	Via Guccione N. 42	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
21	136597	13/12/19	Omissis	Via Mazzini e zona limitrofa	Zona al buio	02/04/20	Intervento già eseguito			
22	136597	13/12/19	Omissis	Via Ossidiana N. 10	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
23	136597	13/12/19	Omissis	Via Monza e zona limitrofa	Zona al buio	02/04/20	Intervento già eseguito			
24	136597	13/12/19	Omissis	Vico Arcadia N. 8	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
25	136597	13/12/19	Omissis	Via Rosselli	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
26	136597	13/12/19	Omissis	Piazza A. Moro N. 1	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
27	137526	16/12/19	Omissis	Via E. Romagnoli N. 130	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
28	137526	16/12/19	Omissis	Via Castore N. 9	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
29	137526	16/12/19	Omissis	Viale Indipendenza	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
30	137526	16/12/19	Omissis	Via Cairolo N. 14	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
31	137526	16/12/19	Omissis	Piazza A. Moro N. 1	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
32	138200	17/12/19	Omissis	Via A. Nobel N. 33	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
33	17279	13/02/20	Omissis	Via Juvara N. 54	Ricollocazione palo	02/04/20	Intervento in programmazione			
34	8462	23/01/20	Omissis	C/so V. Emanuele N. 166	Sostituzione lampada	02/04/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta fusibile	
35	6457	20/01/20	Omissis	Via I. Petrocic Pavlon	Sostituzione lampada	02/04/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Lampada Led	55W
36	15658	10/02/20	Omissis	Via I. Petrocic Pavlon	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
37	26804	06/03/20	Omissis	Via I. Petrocic Pavlon	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
38	6457	20/01/20	Omissis	Via F.Ili Bandiera N. 99	Sostituzione lampada	02/04/20	Intervento già eseguito			
39	19585	18/02/20	Omissis	Via F.Ili Bandiera N. 155	Sostituzione lampada	02/04/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
40	1997	14/01/20	Omissis	C/so V. Emanuele N. 166	Sostituzione lampada	03/04/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
41	1997	14/01/20	Omissis	C/so V. Emanuele N. 198	Sostituzione lampada	03/04/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
42	6457	20/01/20	Omissis	C/so V. Emanuele N. 166	Sostituzione lampada	03/04/20	Intervento già eseguito			
43	6457	20/01/20	Omissis	C/so V. Emanuele N. 166	Sostituzione lampada	03/04/20	Intervento già eseguito			
44	138200	17/12/19	Omissis	Via Plutarco N. 58	Sostituzione lampada	03/04/20	Intervento già eseguito			
45	138200	17/12/19	Omissis	Via Sicani N. 14	Sostituzione lampada	03/04/20	Intervento già eseguito			
46	18266	14/02/20	Omissis	Via Imola N. 4	Sostituzione lampada	03/04/20	Intervento già eseguito			
47	138200	17/12/19	Omissis	Via Meli N. 45	Sostituzione lampada	03/04/20	Intervento già eseguito			
48	138200	17/12/19	Omissis	Via Moscato N. 26	Sostituzione lampada	03/04/20	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
49	138906	18/12/19	Omissis	Via Picceri	Zona al buio	03/04/20			Intervento già eseguito	
50	138906	18/12/19	Omissis	Via Empedocle N. 29	Sostituzione lampada	03/04/20			Intervento già eseguito	
51	138906	18/12/19	Omissis	Via Bagnasco N. 30	Sostituzione lampada	03/04/20			Intervento già eseguito	
52	139402	19/12/19	Omissis	Via Plutarco N. 62	Sostituzione lampada	03/04/20			Intervento già eseguito	
53	139402	19/12/19	Omissis	Via Liguria N. 65	Sostituzione lampada	03/04/20			Intervento già eseguito	
54	139402	19/12/19	Omissis	Via Stenone N. 3	Sostituzione lampada	03/04/20			Intervento già eseguito	
55	139402	19/12/19	Omissis	C/so V. Emanuele c/o unicredit	Sostituzione lampada	03/04/20			Intervento già eseguito	
56	7829	22/01/20	Omissis	Via F.Ili Bandiera N. 99	Sostituzione lampada	03/04/20			Intervento già eseguito	
57	9062	24/01/20	Omissis	Via F.Ili Bandiera N. 99	Sostituzione lampada	03/04/20			Intervento già eseguito	
58	6457	20/0/20	Omissis	Via Imola N. 4	Sostituzione lampada	03/04/20			Competenza Enel	
59	28510	12/03/20	Omissis	Via Imola N. 4	Sostituzione lampada	03/04/20			Competenza Enel	
60	896	07/01/20	Omissis	Via Enna N. 11	Sostituzione lampada	03/04/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta fusibile	
61	21873	24/02/20	Omissis	Via Enna N. 11	Sostituzione lampada	03/04/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta fusibile	
62	21873	24/02/20	Omissis	Via P. Uccello N. 23	Sostituzione lampada	06/04/20	Sost.	2	Lampade Led	55W
							Sost.	1	Porta Lampada	E 40
63	6457	20/01/20	Omissis	Via N. Paci N. 25	Sostituzione lampada	08/04/20	Sost.	2	Lampade Led	55W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
64	Sollecito	06/04/20	Omissis	Via Nardini N. 29	Sostituzione lampada	08/04/20	Sost.	1	Lampade Led	35W
							Sost.	1	Porta Lampada	E 27
65	Sollecito	06/04/20	Omissis	Via Smecca angolo Via Mameli e Via Salerno	Sostituzione lampada	08/04/20	Sost.	3	Lampade Led	35W
66	Sollecito	06/04/20	Omissis	Via Istria vicino la torre	Sostituzione lampada	08/04/20	Sost.	1	Lampade Led	55W
67	Sollecito	06/04/20	Omissis	Via Mazzini N. 49	Sostituzione lampada	09/04/20	Sost.	1	Lampade Led	35W
68	Sollecito	06/04/20	Omissis	Via De Pisis N. 44	Sostituzione lampada	09/04/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
69	13195	04/02/20	Omissis	Via Liguria N. 7	Sostituzione lampada	15/04/20	Sost.	1	Lampada Led	55W
70	18266	14/02/20	Omissis	Via dei Trifogli	Sostituzione lampada	22/04/20	Inst.	1	Plafoniera	riciclata
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Fusibile	
71	13195	05/02/20	Omissis	Vico Icaro	Sostituzione lampada	27/04/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
72	23018	26/02/20	Omissis	Via G. Puccini N. 6	Sostituzione lampada	28/04/20	Sost.	4	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Fusibile	

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
<b>73</b>		15/04/20	Omissis	Via Puglia	Zona al buio	28/04/20			Intervento già eseguito	
<b>74</b>	24206	02/03/20	Omissis	Via XXIV Maggio N. 12	Sostituzione lampada	29/04/20			Competenza Enel	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1		01/04/20	Settore LL.PP.	Via Tevere angolo Via M. Aurelio	Sostituzione lampada	01/04/20	Sost.	1	Lampada led	55 W
2		02/04/20	Ghelas	Via degli Anemoni	Ricollocazione plafoniera	02/04/20	Inst.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Mt.	10	Cavo Fror	3X1.5mm
3	Richiesta telefonica	02/04/20	Settore LL.PP.	Via Matteotti angolo Via Cherubini	Ricollocazione plafoniera	02/04/20	Inst.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	1	Lampada led	35 W
4		06/04/20	Ghelas	Via Flaminia N. 3	Sostituzione lampada	06/04/20	Sost.	2	Lampada led	55 W
5	Progetto led	06/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N. 230 al palo N. 239	Installazione armature stradali	06/04/20	Inst.	10	Armature stradali a led	60W
							Mt.	20	Cavo Fror	3X1.5mm
							Sost.	5	Fusibili	
							Util.	8	Mammut	4mm
6	Progetto led	07/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N. 215 al palo N. 229	Installazione armature stradali	07/04/20	Inst.	15	Armature stradali a led	60W
							Mt.	30	Cavo Fror	3X1.5mm
							Sost.	8	Fusibili	
							Util.	10	Mammut	4mm
7		08/04/20	Ghelas	Via P. Uccello Via N. Minardi	Timer astronomico	08/04/20	Sost.	2	Timer astronomici	



N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
8	Progetto led	08/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N. 205 al palo N. 214 saltato il palo n. 211 per mancanza tronchetto.	Installazione armature stradali	08/04/20	Inst.	9	Armature stradali a led	60W
							Mt.	14	Cavo Fror	3X1.5mm
							Sost.	6	Fusibili	
							Util.	9	Mammuto	4mm
9		09/04/20	Ghelas	Via B. Croce	Timer astronomico	09/04/20	Sost.	1	Timer astronomico	
10	Progetto led	09/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N.196 al palo N.205	Installazione armature stradali	09/04/20	Inst.	10	Armature stradali a led	60W
							Mt.	34	Cavo Fror	3X1.5mm
							Util.	6	Fusibili	
11	Progetto led	10/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N.191 al palo N.195	Installazione armature stradali	10/04/20	Inst.	5	Armature stradali a led	60W
							Sost.	2	Interruttori magnetotermici	25 A
							Mt.	4	Cavo budilico	1X10
12	Progetto led	14/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N. 176 al palo N. 190	Installazione armature stradali	14/04/20	Inst.	15	Armature stradali a led	60 W
							Mt.	30	Cavo Fror	3X1.5mm
							Util.	10	Fusibili	
13		14/04/20	Ghelas	Viale Mediterraneo sotto il calvario	Regolazione timer	14/04/20	Regolato timer			
				Viale Indipendenza Via Botta						
				Via Botallo - Via Seneca						

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14	Progetto led	15/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.166 al palo N.175	Installazione armature stradali	15/04/20	Inst.	10	Armature stradali a led	60W
							Mt.	16	Cavo Fror	3X1.5mm
							Util.	7	Fusibili	
15	Progetto led	16/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.156 al palo N.165	Installazione armature stradali	16/04/20	Inst.	10	Armature stradali a led	60 W
							Util.	5	Fusibili	
16	Progetto led	17/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.146 al palo N.155	Installazione armature stradali	17/04/20	Inst.	10	Armature stradali a led	60W
							Mt.	14	Cavo Fror	3X1.5mm
							Util.	5	Fusibili	
17	Richiesta telefonica	20/04/20	Settore LL.PP.	Via Martoglio	Controllo impianto	20/04/20	Sost.	2	Lampade led	55W
							Sost.	2	Fusibili	
18	Progetto led	20/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.126 al palo N.133	Installazione armature stradali	20/04/20	Inst.	8	Armature stradali a led	60 W
							Util.	4	Fusibili	
19	Progetto led	20/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.134 al palo N.145	Installazione armature stradali	20/04/20	Inst.	12	Armature stradali a led	60 W
							Util.	8	Fusibili	
20	Progetto led	21/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.4 al palo N.12	Installazione armature stradali	21/04/20	Inst.	8	Armature stradali a led	60W
							Mt.	20	Cavo Fror	3X1.5mm
							Util.	2	Portafusibili	
							Util.	3	Fusibili	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
21	Richiesta telefonica	21/04/20	Settore LL.PP.	Via Salonicco	Controllo impianto	21/04/20	Sost.	3	Lampade led	35W
							Sost.	2	Portalampada	E27
22	Progetto led	21/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.110 al palo N.124	Installazione armature stradali	21/04/20	Inst.	15	Armature stradali a led	60 W
Rilevato assorbimento prima dell'installazione; L1 30A - L2 30A - L3 15A										
23	Progetto led	22/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.13 al palo N.22	Installazione armature stradali	22/04/20	Inst.	10	Armature stradali a led	60W
							Mt.	28	Cavo Fror	3X1.5mm
							Util.	5	Fusibili	
24	Progetto led	22/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.97 al palo N.109	Installazione armature stradali	22/04/20	Inst.	13	Armature stradali a led	60 W
							Si riscontra la mancanza di cavi dal palo n. 96 al palo n.97 e dal palo n. 80 al palo n. 93 per 1500 mt.circa			
25	Progetto led	23/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.23 al palo N.132	Installazione armature stradali	23/04/20	Inst.	10	Armature stradali a led	60W
							Inst.	1	Armature stradali a led	100W
							Mt.	14	Cavo Fror	3X1.5mm
							Mt.	6	Cavo budilico	1X6mm
							Util.	6	Fusibili	
							Util.	12	Mammuto	Ø4
26	Progetto led	23/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfria dal palo N.86 al palo N.96	Installazione armature stradali	21/04/20	Inst.	11	Armature stradali a led	60 W
							Posa cavo budilico 1X25 dal palo n. 96 al palo n. 97 per mt. 100 circa.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
27	Progetto led	24/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N.33 al palo N.42	Installazione armature stradali	24/04/20	Inst.	10	Armature stradali a led	60W
							Mt.	8	Cavo Fror	3X1.5mm
							Util.	3	Fusibili	
28	Progetto led	24/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N.71 al palo N.85	Installazione armature stradali	24/04/20	Inst.	10	Armature stradali a led	60W
29	Progetto led	27/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N.43 al palo N.49	Installazione armature stradali	27/04/20	Inst.	7	Armature stradali a led	60 W
							Util.	3	Fusibili	
30	Progetto led	27/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N.56 al palo N.70	Installazione armature stradali	27/04/20	Inst.	15	Armature stradali a led	60 W
							Mt.	40	Cavo Fror	3X1.5mm
31	Richiesta telefonica	27/04/20	Settore LL.PP.	Via Carpaccio N. 8-12	Sostituzione lampada	27/04/20	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
32	Progetto led	28/04/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda dal palo N.46 al palo N.50	Installazione armature stradali	28/04/20	Inst.	5	Armature stradali a led	60 W
							Mt.	30	Cavo Fror	3X1.5mm

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		01/04/20	Settore LL.PP.	Via Tevere	Controllo impianto	01/04/20	Sezionamento fasi su tre interruttori unipolari, prova e ripristino impianto.			
2		17/04/20	Settore LL.PP.	Via Navarra angolo Via D. Fischietti	Cavi tranciati	17/04/20	Ripristino cavi tranciati in seguito ad uno scavo.			
							Util.	8	Giunti lineari	16mm
							Mt.	20	Cavo	1X16
3		30/04/20	Ghelas	Via E. Romagnoli angolo Via Cartesio	Zona al buio	30/04/20	Mt.	30	Cavo budilico	1X16
							Util.	8	Giunti lineari	16mm
							Util.	1	Nastro rotolo isolante	
							Sostituiti cavi tranciati e bruciati nei pozzetti d'ispezione, prova e ripristino impianto della pubblica illuminazione.			

Report  
Manutenzione pubblica illuminazione  
interventi in reperibilità  
mese di aprile 2020

<b>N.</b>	<b>Email Fax Pec</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
1	Richiesta telefonica	10/04/20	Coordinatore Ghelas	Parcheggio Arena	Controllo allarme	10/04/20				Disattivata momentaneamente zona in allarme.
2	Richiesta telefonica	11/04/20	Coordinatore Ghelas	Parcheggio Arena	Controllo allarme	11/04/20				Ripristino sistema d'allarme disattivato la sera precede, collegamento sensori magazzini piani inferiori livelli -1 e livello -2
3	N. 145	18/04/20	VV.UU.	Via Selinunte e zona limitrofa	Zona al buio	18/04/20				Disattivata momentaneamente una fase perchè in corto, ripristino parziale dell'impianto.
