


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
meze di ottobre 2019

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	25
Interventi U.r.p. retroattive	76
Interventi programmati	31
Interventi in emergenza	25
Interventi in reperibilità	5
Totale interventi	162

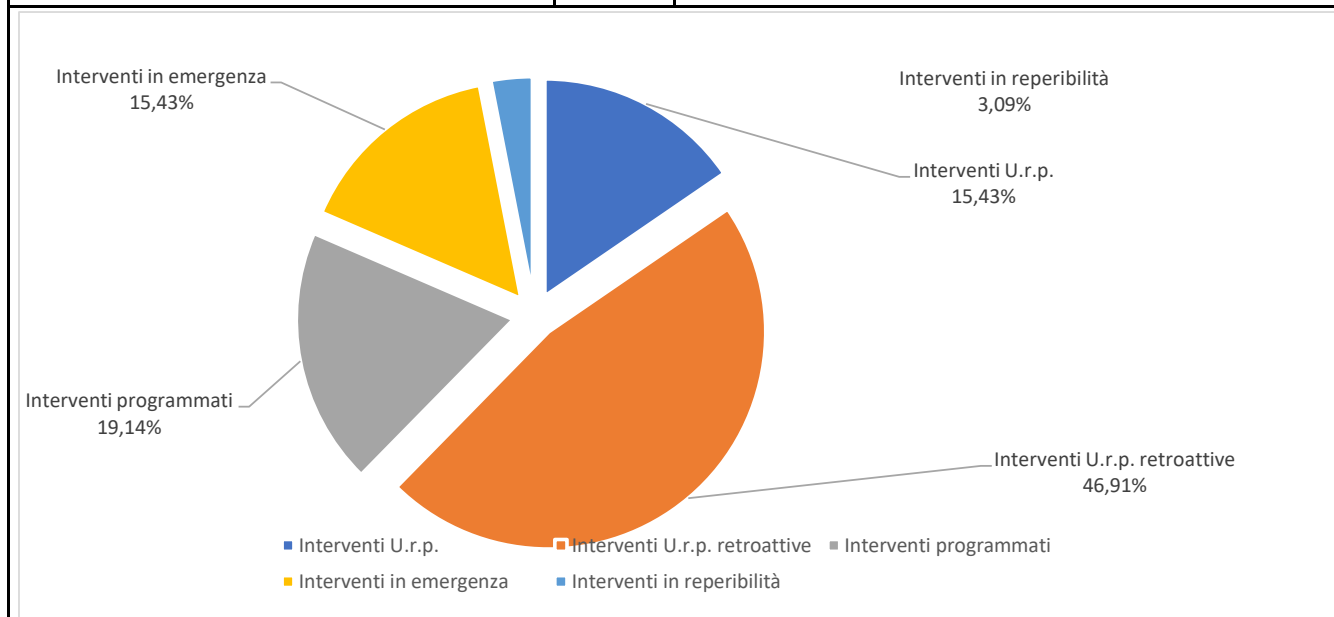

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	104733	02/10/19	Omissis	Via Catilina N. 27	Sostituzione lampada	09/10/19	Intervento già eseguito			
2	104733	02/10/19	Omissis	Via Socrate angolo Via Maratona	Sostituzione lampada	09/10/19	Intervento già eseguito			
3	104730	02/10/19	Omissis	Via J.S. Bach N. 36	Sostituzione lampada	11/10/19	Intervento già eseguito			
4	106163	04/10/19	Omissis	Via J.S. Bach N. 36	Sostituzione lampada	11/10/19	Intervento già eseguito			
5	106163	04/10/19	Omissis	Via Sammito N. 31	Sostituzione lampada	11/10/19	Intervento già eseguito			
6	106163	04/10/19	Omissis	Via F.lli Bandiera angolo Via Sammito	Sostituzione lampada	11/10/19	Intervento già eseguito			
7	107238	08/10/19	Omissis	Via Mantegazza	Zona al buio	11/10/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
8	107238	08/10/19	Omissis	Via talete N. 8	Zona al buio	11/10/19	Intervento già eseguito			
9	107238	08/10/19	Omissis	Via delle Castagne	Sostituzione lampada	11/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
10	106362	07/10/19	Omissis	Via Italia N. 9	Reattore rumoroso	14/10/19	Cablare n. 2 plafoniere trovate aperte			
11	106362	07/10/19	Omissis	Via Segrè N. 6	Sostituzione lampada	14/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
12	106727		Omissis	Via Morselli	Sostituzione lampada	14/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
13	104730	02/10/19	Omissis	Via Sammartini N. 48	Sostituzione lampada	14/10/19	Sost.	3	Lampada Led	35 W
14	108554	10/10/19	Omissis	Via Tarapaca N. 9	Ricollocazione palo	15/10/19	Intervento già programmato			
15	104733	02/10/19	Omissis	Via Perla "Poggio Blasco"	Sostituzione lampada	15/10/19	Sost.	3	Lampada Led	35 W
16	108554	10/10/19	Omissis	Cavalcavia pedonale Via Lecce Via Manfredini	Sostituzione lampada	15/10/19	Sost.	12	Neon led	18 W
17	104730	02/10/19	Omissis	Via S. Giorgio N. 10	Sostituzione lampada	18/10/19	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
18	106163	04/10/19	Omissis	Via Puglia N. 27	Sostituzione lampada	21/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
19	106163	04/10/19	Omissis	Via Puglia N. 20	Sostituzione lampada	21/10/19	Intervento già eseguito			
20	107240	08/10/19	Omissis	Via delle Dune	Sostituzione lampada	22/10/19	Inst.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	4	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	3	Fusibile	
							Mt.	8	Cavo Fror	3X1.5
21	106163	04/10/19	Omissis	Via Butera N. 46	Sostituzione lampada	22/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
22	111928	17/10/19	Omissis	Via Arica N. 9	Sostituzione lampada	24/10/19	Sost.	4	Lampada Led	35 W
							Sost.	3	Lampada Led	55 W
							Sost.	3	Fusibile	
							Sost.	3	Porta lampada	E 27
23	106163	04/10/19	Omissis	Via Rio de Janeiro	Zona al buio	25/10/19	Impianto funzionante			
24	109188	11/10/19	Omissis	Viale Cortemaggiore N. 21	Sostituzione lampada	29/10/19	Punto luce funzionante			
25	108562	10/10/19	Omissis	Via Fleming N. 4	Sostituzione lampada	31/10/19	Sost.	3	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	102292	26/09/19	Omissis	Via Maldive N. 1	Ricollocazione plafoniera	01/10/19	Non si riscontrano punti luci nella via indicata.			
2	94147	05/09/19	Omissis	Via Fontanarossa	Sostituzione lampada	02/10/19 03/10/19	Sost.	8	Lampada Led	35 W
3	82438	29/07/19	Omissis	Via B. Bonanno N. 119	Sostituzione lampada	03/10/19	Sost.	1	Fusibile	
4	94149	05/09/19	Omissis	Via B. Bonanno N. 142	Sostituzione lampada	03/10/19	Intervento già eseguito			
5	99104	19/09/19	Omissis	Via F. Bandiera N. 109	Sostituzione lampada	03/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
6	99103	19/09/19	Omissis	Via F. Bandiera N. 109	Sostituzione lampada	03/10/19	Intervento già eseguito			
7	100680	23/09/19	Omissis	Via F. Bandiera N. 109	Sostituzione lampada	03/10/19	Intervento già eseguito			
8	96682	13/09/19	Omissis	Via Smecca angolo Via F. Bandiera	Sostituzione lampada	03/10/19	Intervento già eseguito			
9	94150	05/09/19	Omissis	Via F. Bandiera N. 79	Sostituzione lampada	03/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
10	92822	05/09/19	Omissis	Via F. Bandiera N. 79	Sostituzione lampada	03/10/19	Intervento già eseguito			
11	94992	09/09/19	Omissis	Via F. Bandiera N. 79	Sostituzione lampada	03/10/19	Intervento già eseguito			
12	99528	19/09/19	Omissis	Via F. Bandiera N. 109	Sostituzione lampada	03/10/19	Intervento già eseguito			
13	99104	19/09/19	Omissis	Via Orzivecchi	Sostituzione lampada	04/10/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
14	92822	05/09/19	Omissis	Via Guccione N. 13	Sostituzione lampada	04/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
15	103491	30/09/19	Omissis	Via Guccione N. 13	Sostituzione lampada	04/10/19	Intervento già eseguito			
16	100680	23/09/19	Omissis	Via Giusti N. 13	Sostituzione lampada	04/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
17	94149	05/09/19	Omissis	Via S. Giusti N. 1	Sostituzione lampada	04/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
18	103490	30/09/19	Omissis	Via P.L. da Palestrina	Sostituzione lampada	04/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Rimossa plafoniera penzolante e sostituita con una riciclata.			
19	80052	22/07/19	Omissis	Via dei Papaveri	Sostituzione lampada	07/10/19	Intervento già eseguito			
20	106742	23/09/19	Omissis	Via Sammito angolo Via Amendola	Sostituzione lampada	07/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
21	94991	09/09/19	Omissis	Via Sammito N. 37	Sostituzione lampada	07/10/19	Intervento già eseguito			
22	97746	16/09/19	Omissis	Via Sammito angolo Via Amendola	Sostituzione lampada	07/10/19	Intervento già eseguito			
23	96682	13/09/19	Omissis	Via Risorgimento N. 119	Sostituzione lampada	07/10/19	Sost.	1	Fusibile	
24	101419	25/09/19	Omissis	Via Risorgimento N. 115	Sostituzione lampada	07/10/19	Sost.	1	Fusibile	
25	96682	13/09/19	Omissis	Via dei Papaveri N. 18	Sostituzione lampada	07/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
26	99531	19/09/19	Omissis	Via dei Papaveri N. 18	Sostituzione lampada	07/10/19	Intervento già eseguito			
27	94992	09/09/19	Omissis	Via Garibaldi N. 35	Sostituzione lampada	07/10/19	Intervento già eseguito			
28	97746	16/09/19	Omissis	Via Garibaldi N. 87	Sostituzione lampada	07/10/19	Intervento già eseguito			
29	99103	19/09/19	Omissis	Via Garibaldi N. 75	Sostituzione lampada	07/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
30	99104	19/09/19	Omissis	Via Paletrina N. 4	Sostituzione lampada	08/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
31	103491	30/09/19	Omissis	Via B. Croce	Zona al buio	09/10/19	Rimossa fotocella guasta e installato timer.			
32	102292	26/09/19	Omissis	Via Canada N. 58	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
33	103490	30/09/19	Omissis	Via Canada N. 16	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	1	Fotocellula	
34	94991	09/09/19	Omissis	Via Orzivecchi N. 5	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
35	85329	06/08/19	Omissis	Via S. Salvo parcheggio	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
36	100677	23/09/19	Omissis	Via S. Salvo N. 17	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
37	97739	16/09/19	Omissis	Via S. Salvo N. 17	Sostituzione lampada	09/10/19	Intervento già eseguito			
38	97744	16/09/19	Omissis	Via S. Salvo N. 2	Sostituzione lampada	09/10/19	Intervento già eseguito			
39	94992	09/09/19	Omissis	Via Socrate angolo Via Maratona	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
40	102292	26/09/19	Omissis	Via Socrate angolo Via Maratona	Sostituzione lampada	09/10/19	Intervento già eseguito			
41	102292	26/09/19	Omissis	Via Socrate angolo Via Maratona	Sostituzione lampada	09/10/19	Intervento già eseguito			
42	97744	16/09/19	Omissis	Via Socrate angolo Via Maratona	Sostituzione lampada	09/10/19	Intervento già eseguito			
43	96682	13/09/19	Omissis	Via Socrate angolo Via Maratona	Sostituzione lampada	09/10/19	Intervento già eseguito			
44	88924	22/08/19	Omissis	Via delle Genziane N. 4	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
45	64420	07/06/19	Omissis	Via delle Genziane	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
46	84833	05/08/19	Omissis	Via della Ruta	Sostituzione lampada	09/10/19	Intervento già eseguito			
47	103490	30/09/19	Omissis	Via Chopin N. 38	Palo pericolante	09/10/19	Non si riscontra nessun palo pericolante al N. 38			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
48	80394	23/07/19	Omissis	Via della Ruta	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Mont.	1	Plafoniera riciclata	
							Mt.	1	Cavo	3X1,5
49	66479		Omissis	Via delle Genziane	Sostituzione lampada	09/10/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
50	103491	30/09/19	Omissis	Via Talete	Sostituzione lampada	11/10/19	Intervento già eseguito			
51	85328	06/08/19	Omissis	Via Palazzi N. 102	Sostituzione lampada	11/10/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
52	70083	26/06/19	Omissis	Via del Fieno	Sostituzione lampada	16/10/19	Intervento già eseguito			
53	73762	08/07/19	Omissis	Via del Fieno	Sostituzione lampada	16/10/19	Intervento già eseguito			
54	76780	15/07/19	Omissis	Via del Fieno	Sostituzione lampada	16/10/19	Intervento già eseguito			
55	96682	13/09/19	Omissis	Piazza Trento N. 3	Sostituzione lampada	16/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Plafoniera riciclata	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
56	52120	10/05/19	Omissis	Via del Fieno	Sostituzione lampada	16/10/19	Sost.	6	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
							Rimossa n. 1 plafoniera penzolante			
Sost.	1	Porta lampada	E 40							
57	92822	05/09/19	Omissis	Via Lipari N. 4	Sostituzione lampada	17/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
58	106742	23/09/19	Omissis	Via della Menta	Sostituzione lampada	17/10/19	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
59	96682	13/09/19	Omissis	Via S. Giorgio N. 10	Sostituzione lampada	18/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Riposizionata plafoniera penzolante.			
60	92822	05/09/19	Omissis	Via S. Giorgio N. 10	Sostituzione lampada	18/10/19	Intervento già eseguito			
61	96682	13/09/19	Omissis	Via Islanda N. 12	Sostituzione lampada	18/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
62	103491	30/09/19	Omissis	Via Giuffrida N. 25/27	Sostituzione lampada	18/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
63	92822	05/09/19	Omissis	Via Giuffrida N. 25/27	Sostituzione lampada	18/10/19	Intervento già eseguito			
64	99106	19/09/19	Omissis	Via Giuffrida N. 25/27	Sostituzione lampada	18/10/19	Intervento già eseguito			
65	96682	13/09/19	Omissis	Via Fazzello N. 119	Sostituzione lampada	18/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
66	99528	19/09/19	Omissis	Via Selinunte N. 12	Sostituzione lampada	21/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
67	92822	05/09/19	Omissis	Chiesa Evangelica Settefarine	Sostituzione lampada	21/10/19	Sost.	7	Lampada Led	35 W
							Sost.	7	Porta lampada	E 27
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
68	86597	09/08/19	Omissis	Via Torre di Manfreda N. 197-198-199	Sostituzione lampada	21/10/19	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
69	99103	19/09/19	Omissis	Via Torre di Manfreda N. 191-195	Sostituzione lampada	21/10/19	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Rimosse n. 5 plafoniere rotte e penzolanti, punti luce messi in sicurezza.			
70	94147	05/09/19	Omissis	Via Demarete N. 6	Sostituzione lampada	22/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
71	94147	05/09/19	Omissis	C/so V. Emanuele	Sostituzione lampada	24/10/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Mt.	1	Fusibile	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
72	101419	25/09/19	Omissis	Via Perosi angolo Via Leoncavallo	Sostituzione lampada	28/10/19			Intervento già eseguito	
73	100680	23/09/19	Omissis	Via Perosi N. 3	Sostituzione lampada	28/10/19			Intervento già eseguito	
74	99103	19/09/19	Omissis	Via Perosi angolo Via Leoncavallo	Sostituzione lampada	28/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
75	90919	28/08/19	Omissis	Via Recanati N. 193	Sostituzione lampada	29/10/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Ioduri Metallici	150 W
76	102293	26/09/19	Omissis	Via A. Sammito N. 125	Sostituzione lampada	29/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Progetto Led	01/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto angolo Via Borsellino - ingresso porto rifugio"	Sostituzione plafoniere	01/10/19	Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di sodio.			
							Sost.	12	Armature stradali a led	137 W
2	Progetto Led	02/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto angolo Via Borsellino - ingresso porto rifugio"	Sostituzione plafoniere	02/10/19	Sost.	9	Armature stradali a led	137 W
							Sost.	1	Ponchiglia palo	Grande
							Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di sodio.			
3	Progetto Led	03/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto ingresso porto rifugio - Club Nautico"	Sostituzione plafoniere	03/10/19	Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
							Sost.	8	Armature stradali a led	123 W
4		03/10/19	Ghelas	Via Simonetti "ingresso Polizia di Stato"	Controllo punto luce	03/10/19	Sost.	2	Lampada Ioduri Metallici	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
5	Progetto Led	04/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto ingresso porto rifugio - Club Nautico"	Sostituzione plafoniere	04/10/19	Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
							Sost.	9	Armature stradali a led	123 W
6		04/10/19	Ghelas	Via Giardinelli ingresso Sede Ghelas	Sostituzione lampada	04/10/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
7	Progetto Led	10/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Club Nautico rotonda est di Macchitella	Sostituzione plafoniere	10/10/19	Sost.	5	Armature stradali a led	96 W
							Sost.	5	Armature stradali a led	50 W
							Mt.	2	Cavo fror	3X1.5
8		10/10/19	Settore LL.PP.	Giardino dell'Auriga	Controllo impianto	10/10/19	Sost.	21	Lampada Led	35 W
							Sost.	4	Porta lampada	E 27
9		11/10/19	Settore LL.PP.	Giardino dell'Auriga	Controllo impianto	11/10/19	Sost.	12	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
							Sost.	2	Portella palo	Piccola
10	Progetto Led	11/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Club Nautico - Viale Cortemaggiore.	Sostituzione plafoniere	11/10/19	Sost.	4	Armature stradali a led	50 W
							Sost.	4	Armature stradali a led	98 W
							Mt.	2	Cavo fror	3X1.5
							Sost.	2	Fusibili	
							Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
11	Progetto Led	14/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Club Nautico - Viale Cortemaggiore.	Sostituzione plafoniere	14/10/19	Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
							Sost.	5	Armature stradali a led	98 W
							Sost.	5	Armature stradali a led	50 W
							Sost.	4	Fusibili	
							Mt.	2	Cavo fror	3X1.5

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
12		14/10/19	Ghelas	Viale Cortemaggiore portici	Controllo impianto	14/10/19	Sost.	10	Neon led	9 W
13	Progetto Led	15/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Club Nautico - Viale Cortemaggiore.	Sostituzione plafoniere	15/10/19	Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
							Sost.	5	Armature stradali a led	98 W
							Sost.	5	Armature stradali a led	50 W
							Sost.	1	Portella palo	Piccola
							Sost.	3	Fusibili	
							Mt.	2	Cavo fror	3X1.5
14	Progetto Led	16/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Club Nautico - Viale Cortemaggiore.	Sostituzione plafoniere	16/10/19	Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
							Sost.	3	Armature stradali a led	98 W
							Sost.	3	Armature stradali a led	50 W
							Mt.	2	Cavo fror	3X1,5
15	Progetto Led	17/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Club Nautico - Viale Cortemaggiore.	Sostituzione plafoniere	17/10/19	Sost.	4	Armature stradali a led	98 W
							Sost.	1	Armature stradali a led	50 W
							Mt.	8	Cavo fror	3X2.5
							Mt.	2	Cavo fror	3X1.5
							Sost.	1	Portella palo	Piccola
							Sost.	2	Fusibili	
							Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
16	Progetto Led	18/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Club Nautico - Viale Cortemaggiore.	Sostituzione plafoniere	18/10/19	Sost.	5	Armature stradali a led	98 W
							Sost.	5	Armature stradali a led	50 W
							Mt.	8	Cavo fror	3X2.5
							Mt.	4	Cavo fror	3X1.5
							Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
17	Progetto Led	23/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Club Nautico - Viale Cortemaggiore.	Sostituzione plafoniere	23/10/19	Sost.	5	Armature stradali a led	98 W
							Sost.	5	Armature stradali a led	50 W
							Mt.	2	Cavo fror	3X1.5
							Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
18		25/10/19	Ghelas	Via Amantea	Sostituzione lampada	25/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
19		25/10/19	Ghelas	Vie cittadine	Regolazione timer	25/10/19	Regolazione timer per cambio ora legale/solare			
				Via Tommaso da Lampedusa	Sostituzione timer		Sost.	1	Timer	
				Via Venezia			Sost.	1	Timer	
20		25/10/19	Ghelas	Via Mongibello	Sostituzione lampada	25/10/19	Sost.	4	Lampada Led	35 W
							Sost.	5	Lampada Led	55 W
							Sost.	4	Porta lampada	E 27
							Mt.	3	Cavo Fror	3X1.5
							Sost.	2	Portella palo	Piccola

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
21		28/10/19	Ghelas	Via Pericle N. 31	Sostituzione lampada	28/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
22		29/10/19	Ghelas	Via Marte N. 11	Sostituzione lampada	29/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
23	Progetto Led	29/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Tropico Med - Viale Cortemaggiore.	Sostituzione plafoniere	29/10/19	Sost.	3	Armature stradali a led	98 W
							Sost.	3	Armature stradali a led	50 W
							Mt.	2	Cavo fror	3X1.5
							Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
24		29/10/19	Ghelas	Via dell'Ambrosia N. 11	Sostituzione plafoniere	29/10/19	Sost.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
25		29/10/19	Ghelas	Via del Ribes	Sostituzione lampada	29/10/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Fusibile	
26	Progetto Led	30/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia "tratto Tropico Med - Viale Cortemaggiore.	Sostituzione plafoniere	30/10/19	Sost.	3	Armature stradali a led	98 W
							Sost.	2	Armature stradali a led	50 W
							Mt.	3	Cavo fror	3X1.5
							Smontate e consegnate in cantiere, plafoniere vapori di mercurio.			
27		30/10/19	Settore LL.PP.	Via Talete N. 15	Sostituzione lampada	30/10/19	Sostituita una plafoniera a led fornita dalla ditta Gerbino perchè non funzionante			
28		30/10/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia lato fiume Gela	Sostituzione lampada	30/10/19	Sostituita una plafoniera a led fornita dalla ditta Gerbino perchè non funzionante			
29		31/10/19	Ghelas	Via saturano N. 8	Sostituzione lampada	31/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
30		31/10/19	Settore LL.PP.	Via Canada	Sostituzione plafoniere	31/10/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
31		31/10/19	Settore LL.PP.	C/so V. Emanuele angolo Porta Vittoria	Sostituzione lampada	31/10/19	Sost.	1	Lampada Ioduri Metallici	150 W
							Sost.	1	Lampada Ioduri Metallici	70 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	70 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		01/10/19	Ghelas	Cantina Sociale	Zona al buio	01/10/19			Ripistino cavi sfiammati nel quadro di Via Picasso	
2	Richiesta telefonica	02/10/19	Parroco Chiesa S. Giuseppe	Piazza Salandra	Zona al buio	02/10/19			Ispezionati i pozzetti per rilevamento corto circuito, ripristino cavi bruciati, controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto e ripristino dello stesso.	
3		03/10/19	Ghelas	Piazza Umberto I	Braccio penzolante	03/10/19			Rimosso bracci a lanterna penzolante.	
4	Richiesta telefonica	04/10/19	Arch. M. Cernigliano	Via Palmi	Assistenza tecnica	04/10/19			Fornita assistenza tecnica alla ditta esecutrice dei lavori passaggio fibra.	
5	172	03/10/19	VV.UU.	Via Bach N. 11 - 37	Zona al buio	07/10/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
6	465	07/10/19	VV.UU.	Via P.Botta	Zona al buio	07/10/19			Controllo e ripristino impianto.	
7	468	07/10/19	VV.UU.	Via Istria - Via Colombo	Zona al buio	07/10/19			Controllo e ripristino impianto.	
8		08/10/19	Ghelas	Via Settefarine cavalcavia	Cavi penzolanti	08/10/19	Util.	200	Fascette	PVC
9		10/10/19	Ghelas	Viale Cortemaggiore	Zona al buio	10/10/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.	
10	481	14/10/19	VV.UU.	Via Cappuccini e zona limitrofa	Zona al buio	14/10/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.	
11		17/10/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia di fronte Controcorrente	Pali divelti	17/10/19			Tagliati e rimossi n. 2 pali bucati, punti luce messi in sicurezza.	
12		17/10/19	Ghelas	Via dell'Ambrosia	Plafoniera penzolante	17/10/19			Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
13	485	16/10/19	VV.UU.	C/so S. Aldisio e zona adiacente	Zona al buio	17/10/19	Sost.	1	Contattore	40 A
							Mt.	1	Cavo	
									Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.	
14	3873	09/10/19	Ghelas	Via Sicani	Zona al buio	17/10/19			Si riscontra la mancanza di cavi nel pozzetto d'ispezione.	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
15		18/10/19	Ghelas	Via Cicerone N. 110	Sostituzione lampada	18/10/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
16	Richiesta telefonica	22/10/19	Segreteria	Scuola S. Quasimodo	Palo divelto	22/10/19	Rimosso palo in quanto staccato dalla base, punto luce messo in sicurezza.			
17	4094	21/10/19	VV.UU.	Cantina Sociale	Zona al buio	23/10/19	Impianto funzionante.			
18	494	24/10/19	VV.UU.	C/so V. Emanuele	Zona al buio	24/10/19	Ripristino contatore aperto e staccato.			
19		25/10/19	Ghelas	Viale Mediterraneo segretariato sociale	Lampada penzolante	25/10/19	Riposizionato porta lampada penzolante.			
20		28/10/19	Ghelas	Ex Chiesa S. Lucia	Zona al buio	28/10/19	Mt.	30	Cavo	3X2.5
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
21		28/10/19	Ghelas	Contrada Rabbito	Zona al buio	28/10/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
22		29/10/19	Ghelas	Villetta Settefarine	Zona al buio	29/10/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
23		30/10/19	Ghelas	Cimitero Farello	Zona al buio	30/10/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
24		30/10/19	Ghelas	Via Venezia angolo Via Butera	Zona al buio	30/10/19	Sost.	1	Timer	
25	504	29/10/19	VV.UU.	Via Euritania e zona limitrofa	Zona al buio	29/10/19	Impianto funzionante.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	3783	03/10/19	Settore LL.PP.	C/so V. Emanuele	Collocazione maschere	05/10/19				Si è provveduto alla collocazione di maschere e palloncini, per la manifestazione mezzanotte dei bambini.
2	427	08/10/19	VV.UU.	Via Canada	Zona al buio	08/10/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
3	474	12/10/19	VV.UU.	Via Lecce N. 304	Plafoniera penzolante	12/10/19				Riposizionata plafoniera penzolante, sistemato vetro.
4	501	27/10/19	VV.UU.	Via Navarra e zona limitrofa	Zona al buio	27/10/19				Disattivata momentaneamente una fase in corto, ripristinato parte dell'impianto.
5	502	27/10/19	VV.UU.	Via Anguissola e zona limitrofa	Zona al buio	27/10/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
