


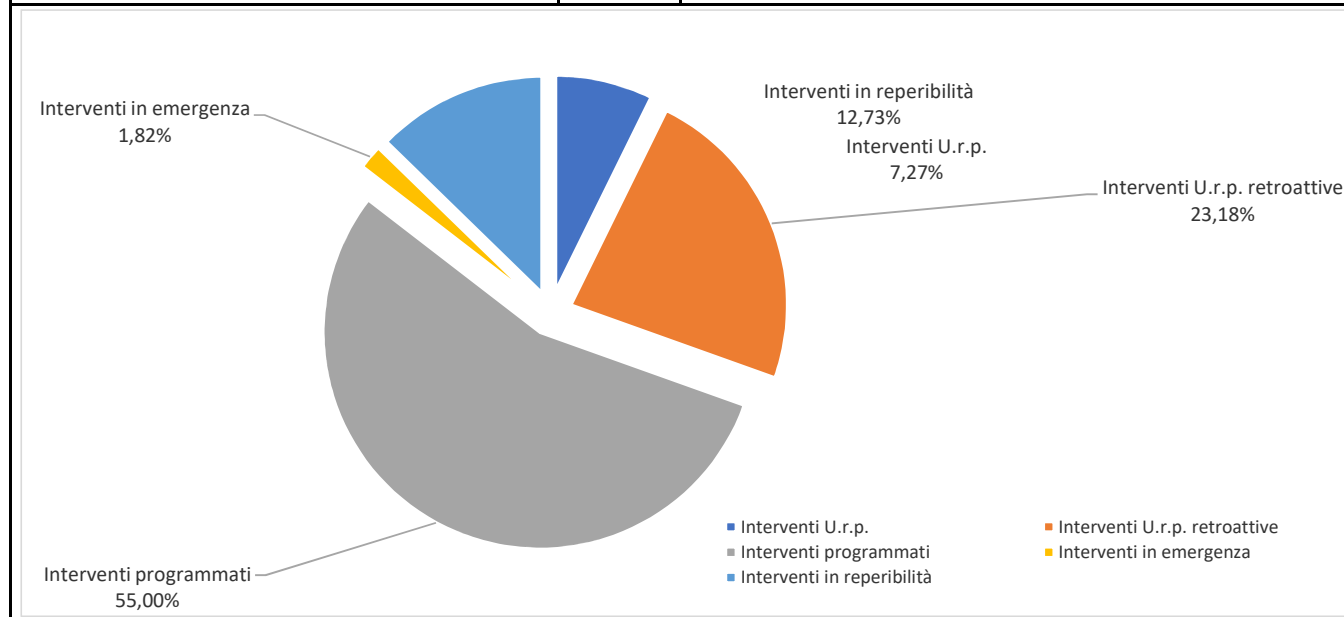
Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
meze di Maggio 2022

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	16
Interventi U.r.p. retroattive	51
Interventi programmati	121
Interventi in emergenza	4
Interventi in reperibilità	28
Totale interventi	220



Ghelas
multiservizi
società per azioni

Società in House Providing
del Comune di Gela



Report
 Manutenzione pubblica illuminazione
 interventi su richieste U.r.p.

Maggio 2022

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1		05/05/22	Omissis	Via San.Giuseppe n.20	Sostituzione Lampade	05/05/22	Intervento eseguito			
2		09/05/22	Omissis	Via Pozzillo	Sostituzione Lampade	09/05/22	Sost.	11	Armatura stradale Led	50W
							Sost.	2	Lampada Led	35W
							Mt.	60	Cavo fror	3G1,5 mmq
3		09/05/22	Omissis	Via Buscemi ang.Via Smecca	Ricollocazione Palo	09/05/22	Intervento eseguito			
4		16/05/22	Omissis	Via Butera ang.Vico Icaro	Diverse Lampade	16/05/22	Intervento eseguito			
5		17/05/22	Omissis	Via Rossellini	Sostituzione Lampade	17/05/22	Eseguito			
6		17/05/22	Omissis	Via Rosselli n.13-19	Sostituzione Lampade	17/05/22	Eseguito			
7		17/05/22	Omissis	Via Totò de Curtis	Sostituzione Lampade	17/05/22	Eseguito			
8		18/05/22	Omissis	Via Giotto n.20	Palo Pericolante	18/05/22	Non di nostra competenza			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
9	50931	05/05/22	Omissis	Via Pascoli	Ricollocazione Palo Luce	26/05/22			Non di nostra competenza	
10	57506	20/05/22	Omissis	Via India n.14 e Via America	Sostituzione Lampade	26/05/22			Eseguito	
11	57506	20/05/22	Omissis	Via Ausonia n.71	Sostituzione Lampade	26/05/22			Eseguito	
12	57512	20/05/22	Omissis	Via Q.Sella n.63	Sostituzione Lampade	26/05/22			Competenza Enel	
13	57512	20/05/22	Omissis	Via Domenicana n.9	Sostituzione Lampade	27/05/22			Eseguito	
14	57506	20/05/22	Omissis	Via Bombelli n.45	Sostituzione Lampade	27/05/22			Eseguito	
15	57512	20/05/22	Omissis	Via Settefarine n.200/228	Sostituzione Lampade	30/05/22			Eseguito	
16	57506	20/05/22	Omissis	Via Enesidano n.26	Sostituzione Lampade	mag-22			Eseguito	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	39018	04/04/22	Omissis	Via Piana Marina Manfria	Collocazione palo	06/04/22	Richiesta messa in lista installazione pali			
2	33653	21/03/22	Omissis	Via Strawiski n.8	Sostituzione Lampade	29/04/22	Ripristino Cavo linea braccio pubblica illuminazione			
3	46898	26/04/22	Omissis	Via Caboto n.5	Sostituzione Lampade	29/04/22	Sost.	1	Lampada Led	35W
4	46898	26/04/22	Omissis	Vico S.Lucia	Sostituzione Lampade	29/04/22	Sost.	1	Lampada Led	35W
5		29/04/22	Omissis	Via Ermocrate n.194	Sostituzione Lampade	29/04/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
6		29/04/22	Omissis	Via Strawiski n.3	Sostituzione Lampade	29/04/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
7	46898	26/04/22	Omissis	Via Legnano n.28	Palo Pericoloso	02/05/22	Palo non pericolante			
8	139946	27/12/21	Omissis	Via Barbabianca n.31	Sostituzione Lampade	04/05/22	Eseguito			
9	31098	15/03/22	Omissis	Via Caravaggio n.59	Sostituzione Lampade	04/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
10	31098	15/03/22	Omissis	Via S.Giuseppe n.20	Sostituzione Lampade	04/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
11	33649	21/03/22	Omissis	Via S.Giuseppe n.27	Sostituzione Lampade	04/05/22	Eseguito			
12	33649	21/03/22	Omissis	Via S.Giuseppe n.20	Sostituzione Lampade	04/05/22	Eseguito			
13	46898	26/04/22	Omissis	Via Livorno n.29	Sostituzione Lampade	09/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
14	46898	26/04/22	Omissis	Via Venezia n.162	Sostituzione Lampade	16/05/22	Eseguito			
15	39018	04/04/22	Omissis	Vico Icaro	Sostituzione Lampade	16/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
16	33653	21/03/22	Omissis	Vico Icaro n.13	Sostituzione Lampade	16/05/22	Eseguito			
17	35595	25/03/22	Omissis	Via Rossellini n.4	Sostituzione Lampade	17/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
18	10121	26/01/22	Omissis	Via P.Rosselli n.4	Sostituzione Lampade	17/05/22	Eseguito			
19	46898	26/04/22	Omissis	Via India ang.Via America	Sostituzione Lampade	17/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo	
20	39508	05/04/22	Omissis	Via Falconara n,4	Sostituzione Lampade	17/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
21	35595	25/03/22	Omissis	Via Falconara n.4	Sostituzione Lampade	17/05/22	Eseguito			
22	35595	25/03/22	Omissis	Via Falconara	Sostituzione Lampade	17/05/22	Eseguito			
23	33649	21/03/22	Omissis	Via Falconara n.4	Sostituzione Lampade	17/05/22	Eseguito			
24	31098	15/03/22	Omissis	Via Falconara n.4	Sostituzione Lampade	17/05/22	Eseguito			
25	46898	26/04/22	Omissis	Via Totò de Curtis	Sostituzione Lampade	17/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
							N.	2	Adattatore Palo	
							N.	1	Adattatore Palo Fabbro	
26	35595	25/03/22	Omissis	Via Totò de Curtis	Sostituzione Lampade	17/05/22	Eseguito			
27	2365	10/01/22	Omissis	Via F.Bandiera n.109-115	Sostituzione Lampade	18/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
28	46898	26/04/22	Omissis	Via Rossellini	Sostituzione Lampade	18/05/22	Eseguito			
29	33653	21/03/22	Omissis	Via Tosti	Sostituzione Lampade	mag-22	Eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
30	15592	08/02/22	Omissis	Via Ausonia n.86	Sostituzione Lampade	24/05/22	Eseguito			
31	6550	19/01/22	Omissis	Via Ausonia n.3	Sostituzione Lampade	24/05/22	Eseguito			
32	2883	11/01/22	Omissis	Via Adriana n.19	Sostituzione Lampade	24/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo	
							Mt.	10	Cavo fror	3G2,5 mmq
33	139946	27/12/21	Omissis	Via Ausonia n.86	Sostituzione Lampade	24/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							Mt.	10	Cavo fror	3G2,5 mmq
34	46898	26/04/22	Omissis	Via Catilina n.15	Sostituzione Lampade	25/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo	
35	33653	21/03/22	Omissis	Via Firenze n.31	Sostituzione Lampade	25/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
36	39018	04/04/22	Omissis	Via Firenze n.29-31	Sostituzione Lampade	25/05/22	Eseguito			
37	31098	15/03/22	Omissis	Via Domenichino n.36	Sostituzione Lampade	mag-22	Eseguito			
38	46898	26/04/22	Omissis	Via Flavia ang.Via Nomentana	Sostituzione Lampade	25/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
							N.	2	Adattatore Palo	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
39	31098	15/03/22	Omissis	Via Enesidano n.30	Sostituzione Lampade	25/05/22	Competenza Enel			
40	35595	25/03/22	Omissis	Via Enesidano n.30	Sostituzione Lampade	25/05/22	Eseguito			
41	39018	04/04/22	Omissis	Via Enesidano n.30	Sostituzione Lampade	25/05/22	Eseguito			
42	46898	26/04/22	Omissis	Via Enesidano n.30	Sostituzione Lampade	25/05/22	Eseguito			
43	31098	15/03/22	Omissis	Via dello Smeraldo	Sostituzione Lampade	26/05/22	Eseguito			
44	10121	26/01/22	Omissis	Vico Selce n.8	Sostituzione Lampade	26/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
							N.	2	Adattatore Palo	
45	7732	31/01/22	Omissis	Vico Selce n.8	Sostituzione Lampade	26/05/22	Eseguito			
46	16805	10/02/22	Omissis	Vico Selce n.8	Sostituzione Lampade Diverse Lampade	26/05/22	Eseguito			
47			Omissis	Via Del Sarto n.35	Sostituzione Lampade	27/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
48			Omissis	Via Domenicana n.15	Sostituzione Lampade	27/05/22	Eseguito			
49			Omissis	Via India	Sostituzione Lampade	27/05/22	Eseguito			
50			Omissis	Via Domenicana n.15	Sostituzione Lampade	27/05/22	Eseguito			
51	94896	06/09/21	Omissis	Via Amantea n.15	Sostituzione Lampade	27/05/22	Eseguito			

Manutenzione pubblica illuminazione
interventi programmati

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1		29/04/22	Omissis	Vico Sciandrello	Progetto Led	29/04/22	Sost.	1	Lampada Led	35W
2		29/04/22	Omissis	Via Archimede ang.Via Ermocrate	Progetto Led	29/04/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
3		29/04/22	Omissis	Via Pablo Picaso	Progetto Led	29/04/22	Sost.	8	Armatura stradale Led	50W
							N.	8	Tronchetti	
4		02/05/22	Omissis	Via Livorno n.422	Progetto Led	02/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
5		02/05/22	Omissis	Via delle Rose e Via delle Mandorle	Progetto Led	02/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
							Sistemazione cavi elettrici tranciati nel pozzetto d'ispezione			
6		02/05/22	Omissis	Via Legnano n.347	Progetto Led	02/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
7		02/05/22	Omissis	Villette Via Toscanini	Sostituzione Lampade	02/05/22	Sost.	5	Lampada Led	35W
8	Prot.n. 49354	02/05/22	Omissis	Via Donizzetti	Installazione Faro	03/05/22	N.	1	Faro Led	200W
	Prot.n. 1841/2022	02/05/22					Mt.	20	Cavo	3x1,5 mmq
							N.	2	Tasselli da 12	
9		03/05/22	Omissis	Via Amendola n.141	Progetto Led	03/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
10		03/05/22	Omissis	Via Sicilia	Progetto Led	03/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	3	Tronchetti	
11		03/05/22	Omissis	Via Magnelli n.2	Progetto Led	03/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
12		03/05/22	Omissis	Via Cardillo n.73	Sostituzione Lampade	03/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
13		03/05/22	Omissis	Via Cassibile ang.Via Tarso	Progetto Led	03/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
							N.	3	Tronchetti	
14		04/05/22	Omissis	Via Tosti	Progetto Led	04/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
							N.	2	Tronchetti	
15		04/05/22	Omissis	Sett.Urbanistico	Progetto Led	04/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
16		04/05/22	Omissis	Via dello Smeraldo n.6	Progetto Led	04/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
17		04/05/22	Omissis	Via Modena	Progetto Led	04/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
18		04/05/22	Omissis	Viale Di Stefano n.13	Progetto Led	04/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
19		04/05/22	Omissis	Via Velasquez n.39	Progetto Led	04/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
20		04/05/22	Omissis	Via Boito n.18	Progetto Led	04/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
21		04/05/22	Omissis	Via Polieno n.95	Progetto Led	04/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
22	Prot.n. 49878/2022	03/05/22	Omissis	Piazza Cappuccini	Posizionamento Panchine	05/05/22	Si e provveduto allo spostamento delle panche			
23		05/05/22	Omissis	Via Cadorna	Progetto Led	05/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
24		05/05/22	Omissis	Piazza Mesaccio	Progetto Led	05/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Fusibile	6A
							Sostituzione con plafoniera a led da 100W			
25		05/05/22	Omissis	Via Bramante	Progetto Led	05/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	100W
							Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
26		05/05/22	Omissis	Via Aurelia n.49	Progetto Led	05/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
27		05/05/22	Omissis	Vie Cittadine zona Piazza Umberto	Ripristino interuttori Astronomici	05/05/22	Sistemazione e ripristino interruttori Astronomici regalati anticipatamente per percorso Settimana Santa			
28		06/05/22	Omissis	Via Cappuccini	Progetto Led	06/05/22	Sost.	2	Lampada Led	35W
29		06/05/22	Omissis	Via Antioco	Sostituzione Cavo	06/05/22	Mt.	15	Cavo	3x 2,5 mmq
30		06/05/22	Omissis	Via Istria e Via Porta Vittoria	Installazione Catenacci	06/05/22	N.	2	Catenacci	
							N.	2	Anelli	
31		06/05/22	Omissis	Via Poggio Blasco ang.Via della Perla	Progetto Led	06/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
							N.	2	Tronchetti	
							Mt.	2	Cavo	3x 1,5 mmq
32		06/05/22	Omissis	Via Buscemi ang.Via Smecca	Progetto Led	06/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
33		06/05/22	Omissis	Via Garibaldi n.17	Progetto Led	06/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
34		06/05/22	Omissis	Via G.Pascoli ang.Via Vasile	Progetto Led	06/05/22	Sost.	6	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
							Mt.	3	Cavo	3x 1,5 mmq

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
35		09/05/22	Omissis	Via Castelluccio n.2-24	Progetto Led	09/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
36		09/05/22	Omissis	Via Nomentana n.56	Progetto Led	09/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
37		10/05/22	Omissis	Via Litz ang. Via Fioreavanti	Progetto Led	10/05/22	Sost.	4	Plafoniere	
							N.	4	Tronchetti	
							N.	1	Adattatore	
38		10/05/22	Omissis	Via Alberti	Progetto Led	10/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
39		10/05/22	Omissis	Via Rosselli n.13-19	Progetto Led	10/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
40		10/05/22	Omissis	Via Scicolone n.7-15	Progetto Led	10/05/22	Sost.	4	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore per plafoniera	
41		10/05/22	Omissis	Via Ostiense ang. Via Aurelio	Progetto Led	10/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore	
42		10/05/22	Omissis	Via Appia	Progetto Led	10/05/22	Sost.	5	Armatura stradale Led	50W
							N.	5	Adattatore	

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
43		11/05/22	Omissis	Via Falcone rotonda con Via Tevere	Progetto Led	11/05/22	Rimozione palo divelto trovato a tema con cavi elettrici messi in sicurezza			
44		11/05/22	Omissis	Via del Topazio	Progetto Led	11/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
45		11/05/22	Omissis	Via Fioravanti e vie limitrofe	Progetto Led	11/05/22	Sost.	7	Armatura stradale Led	50W
							N.	7	Tronchetto	
							N.	3	Adattatori	
							N.	1	Portella Grande	
46		11/05/22	Omissis	Via dello Smeraldo	Progetto Led	11/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
							Mt.	1	Cavo	3x 1,5 mmq
47		11/05/22	Omissis	Via Dello Rubino	Progetto Led	11/05/22	Sost.	5	Armatura stradale Led	50W
							N.	3	Tronchetti	
							Mt.	2	Cavo	3x 1,5 mmq

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
48	Prot.n. 52614	10/05/22	Omissis	Parco Archeologico di Caposoprano -Mura Timolontee	Supporto di un Eletttricista	11-12/05/22			Assistenza Tecnica	
49	Prot.n. 256	10/05/22	Omissis	C/So Sal.Aldisio (tratto largo San Biagio-Piazza San Giacomo)	Strada al buio	11/05/22			Ripristino interruttore spento	
50	Prot.n.254	10/05/22	Omissis	Via Bombelli	Zona al Buio	12/05/22			Da sopralluogo e apertura pozzetti di ispezione ,si riscontra cavi elettrici bruciati .Si richiede scavo da pozzetto a pozzetto	
51		12/05/22	Omissis	Via Perosi n.35	Progetto Led	12/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
							N.	3	Tronchetti	
52	Prot.n.254	10/05/22	Omissis	Via Bombelli	Zona al Buio	12/05/22			Da sopralluogo e apertura pozzetti di riscontro cavi elettrici bruciati. Si richiede scavo da pozzetto a pozzetto	
53		12/05/22	Omissis	Via S.Nicola	Progetto Led	12/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
54		12/05/22	Omissis	Via Brasile ang.Via El Salvador	Progetto Led	12/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
							N.	1	Adattatore	

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
55		13/05/22	Omissis	Via Cesare ang.Via Appia	Progetto Led	13/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
56		13/05/22	Omissis	Via Foppa n.25	Progetto Led	13/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
57		13/05/22	Omissis	Via Leoncavallo	Progetto Led	13/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							Mt.	1	Cavo	3x 1,5 mmq
58		13/05/22	Omissis	Via San Cristoforo	Zona al Buio	13/05/22	N.	1	Contatore	6A
							Mt.	3	Cavo	1x10 mmq
59		13/05/22	Omissis	Via S.M. degli Angeli (discesa Lido Orlando)	Ripristino Contatore	13/05/22	Ripristino Contatore trovato spento			
60		13/05/22	Omissis	Via Botallo	Progetto Led	13/05/22	Sost.	6	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Portella Grande	
							N.	2	Fusibile	
							Ripristino Giunto pozzetto ispezione			
61		13/05/22	Omissis	Via Polizelo	Progetto Led	13/05/22	Sost.	10	Armatura stradale Led	50W
62		16/05/22	Omissis	Via Venezia (Strada alberata)	Progetto Led	16/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
63		16/05/22	Omissis	Via Epicarmo n.75	Progetto Led	16/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
64		16/05/22	Omissis	Via Bonanno n.156	Progetto Led	16/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
65		16/05/22	Omissis	Via America n.31	Progetto Led	16/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo	
66		16/05/22	Omissis	Via Juvara ang.Via G.Pacini	Progetto Led	16/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
67		16/05/22	Omissis	Via Ambrica n.33	Progetto Led	16/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo	
68		18/05/22	Omissis	Via Bouganvillea n.1	Progetto Led	18/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo	
69		18/05/22	Omissis	Via Terone	Progetto Led	18/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
							N.	3	Adattatore Palo	
70		18/05/22	Omissis	Vico Petronio n.9-12	Progetto Led	18/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
71		19/05/22	Omissis	Via Renda n.15	Progetto Led	19/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
72		19/05/22	Omissis	Via India n.4-10	Progetto Led	19/05/22	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo	
73		19/05/22	Omissis	Via Canada n.41	Progetto Led	19/05/22	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
74		20/05/22	Omissis	Via Cardillo n.13	Progetto Led	20/05/22	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
75		20/05/22	Omissis	Via Apollodoro n.4	Progetto Led	20/05/22	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
76	Prot.n.276	16/05/22	Omissis	Via Rosa Balistreri	Zona al Buio	23/05/22	Ripristino Interruttore Generale			
77		23/05/22	Omissis	Via del Ghirlandaio, Via Pordorno e Vie Adiacenti	Zona al Buio	23/05/22	Apertura pozzetti d'ispezione con controllo cavi. Rilevati cavi elettrici bruciati nelle vicinanze Chiesa San Sebastiano a causa di terreni dati a fuoco. Si è provveduto alla pulizia del pozzetto e al ripristino dei cavi elettrici e alle prove impianto			
78		23/05/22	Omissis	Porto Rifuggio	Ripristino Contatore	23/05/22	Ripristino Contatore			

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
79		23/05/22	Omissis	Via Tiziano	Progetto Led	23/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
80	Prot.n. 54200	13/05/22	Omissis	Via Tiziano	Progetto Led	23/05/22	Eseguito			
81	Prot.n. 7732	31/01/22	Omissis	Via L.Perosi n.85	Sostituzione Lampade	23/05/22	Eseguito			
82		23/05/22	Omissis	Via Parnaso n.84	Progetto Led	23/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
83		23/05/22	Omissis	Via Basile n.14	Progetto Led	23/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
84		23/05/22	Omissis	Via Aurelia n.16	Progetto Led	23/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Tronchetto	
85		23/05/22	Omissis	Via Pindaro n.29	Progetto Led	23/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							Mt.	1	Curva palo	90°
							Mt.	5	Cavo	3x 1,5 mmq
86		23/05/22	Omissis	Via Domenichini n.24	Progetto Led	23/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
87		24/05/22	Omissis	Via S.Damaggio	Disattivazione cavo alimentazione	24/05/22	Disattivazione cavo Alimentazione locale			
88		24/05/22	Omissis	Via Cimabue n.2	Progetto Led	24/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
89		24/05/22	Omissis	Via Cimabue n.58	Progetto Led	24/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
90		24/05/22	Omissis	Via E.Mattei	Apertura pozzetti d' ispezione	24/05/22	Apertura pozzetti d' ispezione collegamenti cavi e prova impianto per pali illuminazione mal funzionante			
91		24/05/22	Omissis	Via Adriana n.59	Progetto Led	24/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo	
							Mt.	10	Cavo fror	3G2,5 mmq
92		25/05/22	Omissis	V.le Mazara del Vallo (accanto bar Capannina)	Progetto Led	25/05/22	Ripristino cassetta deviazione perché trovata aperta e rotta			
							Mt.	15	Cavo fror	3G1,5 mmq
93		25/05/22	Omissis	Via Tina Pica	Progetto Led	25/05/22	Sost.	4	Lampada Led	35W
							Sost.	1	Globo	
94		26/05/22	Omissis	Via Nomentana n.34 ang.Via Flavia n.9	Ripristino illuminazione pubblica	26/05/22	Eseguito			
95		26/05/22	Omissis	Via Pisa n.22	Progetto Led	26/05/22	Sost.	1	Lampada V.S.	150W
							Sost.	1	Reattore V.S.	150W
							Sost.	1	Accenditore	

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
96		26/05/22	Omissis	Via Ariosto ang.Via Matteotti	Progetto Led	26/05/22	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
							Mt.	7	Cavo fror	3G1,5 mmq
97		26/05/22	Omissis	Via Bologna n.1	Progetto Led	26/05/22	Sost.	2	Armaturo stradale Led	50W
98		26/05/22	Omissis	Largo Cadore e strade adiacenti	Progetto Led	26/05/22	Sost.	6	Armaturo stradale Led	50W
99		26/05/22	Omissis	Via Stravinski n.56	Progetto Led	26/05/22	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
100		26/05/22	Omissis	Via Matrice	Progetto Led	26/05/22	N.	2	Portalampane	E27
							Sost.	2	Lampada Led	35W
							N.	3	Disattivazione Faretti	
101		27/05/22	Omissis	Via E.Mattei	Progetto Led	27/05/22	Sost.	5	Armaturo stradale Led	50W
							Ripristino cavi cassette deviazione			

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
102		30/05/22	Omissis	Via S.M. degli Angeli	Zona al Buio	30/05/22			Ispezionamento controllo apertura pozzetti. Si rileva palo illuminazione bucato da atti vandalici. Si richiede la pulizia per ripristino dell'impianto	
103	Prot. n. 299	27/05/22	Omissis	Via Orzivecchi n.23	Tombino senza coperchio	31/05/22			Pozzetto non di nostra competenza	
104		31/05/22	Omissis	S.S. 115 Direzione Licata Km 256	Inst.Linea Nuova	31/05/22	Si e provveduto allo scavo con passaggio cavidotto e ripristino ill. Pubblica			
							Mt.	240	cavo budilico	1x10mm q
							Mt.	70	Tubo Corrugato	63mmq
							N.	20	Fischiotti	35mmq
							N.	1	Nastro isolante	
							N.	1	Nastro vulcanizzante	
105		31/05/22	Omissis	S.M. degli Angeli ang.Via delle Rose	Sistemazione cavi elettrici	31/05/22			Sistemazione cavi elettrici bruciati, disattivazione palo illuminazione bruciato a causa di incendio all'impianto	

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
106	Prot. n. 316	30/05/22	Omissis	Via Borromini e vie limitrofe	Zona al Buio	31/05/22	N.	2	Contatori quadripolari	63A
							Mt.	2	Cavo	1x10 mmq
							N.	2	Lucchetto	
							N.	2	occhielli,dadi e rondelle	
							Sostituzione contatori perché bruciati			
							Ripristino impianto pubblica illuminazione			
107	Prot. n. 310	30/05/22	Omissis	Via Venezia ang.Via Tevere	Sistemazione Semaforo	31/05/22	Ripristino semaforo			
							N.	2	Lampada per semaforo	100W
108		06/12/21	Omissis	Via Cassibile ang.Via Minozzi e Via G.Moroni	Palo non Funzionante e Mancanza Palo	mag-22	Eseguito			
109		27/12/21	Omissis	Via Chopin n.58	Pali Pubblica Illuminazione Pericolanti	mag-22	Eseguito			
110		18/01/22	Omissis	Via dell'Agave n.1 c.da Manfria	Ripristino illuminazione pubblica	mag-22	Eseguito			
111		01/02/22	Omissis	Via dell'Agave n.2	Ripristino illuminazione pubblica	mag-22	Eseguito			
				Via Leon Battista Alberti di fronte il civico n.13						
				Via Redi						
				Via San Ferdinando						

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
				Via Danubio						
112		08/02/22	Omissis	Via delle Gardenie	Scarsa Illuminazione	mag-22			Eseguito	
113		09/02/22	Omissis	Via Niscemi ang.Via Venezia	Ripristino illuminazione pubblica	mag-22			Eseguito	
				Via Domenicana ang.Via India						
				Via Fioravanti n.6						
				Viale Mediterraneo dal civico n.127 al n.143						
				Piazzale Hotel Sole						
114	560/2022 del 11/02/22 (prot. Ghelas)	11/02/22	Omissis	Via delle Gardenie	Sostituzione Corpi Illuminanti	mag-22			Eseguito	
	17285/2022 (prot. Comune)									
115		16/02/22	Omissis	Via Africa n.4	Ripristino illuminazione pubblica	mag-22			Eseguito	
				Via A.Scontrino di fronte il civico n.5						
				Via delle Gardenie						

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi programmati

Maggio 2022

N.	Protocollo	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
116		23/02/22	Omissis	Via Pisticchi n.2	Sostituzioni Lampade	mag-22			Eseguito	
117		25/02/22	Omissis	Via Fontanarossa n.22	Palo illuminazione	mag-22			Eseguito	
118		07/03/22	Omissis	Via Cairoli n.195-197	Ripristino illuminazione pubblica	mag-22			Eseguito	
				Piazza Rento						
				Istituto Scolastico Verga Via Salonicco						
				Via Gallipoli						
119		17/03/22	Omissis	Via Firenze n.33	Strada al buio	mag-22		Eseguito		
120		24/03/22	Omissis	Via Liguria n.16	Ripristino illuminazione pubblica	mag-22			Eseguito	
				Via Cagliari n.9						
				Via Fontanarossa n.22						
121		08/04/22	Omissis	Via Pozzillo	Ripristino illuminazione pubblica	mag-22			Eseguito	
				Via Torre di Manfredia						

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		02/05/22	Omissis	Via Licata ang. Via Venezia	Ripristino cavi elettrici	02/05/22	Ripristino cavi elettrici tranciati			
							N.	3	Giunti lineari	
2	Prot. n.281	21/05/22	Omissis	Via Bombelli	Zona al Buio	21/05/22	Si e provveduto a effettuare scavo			
							Sost.	7	Armatura stradale Led	50W
							Mt.	140	Cavo budilico	1x10 mmq
							N.	12	Giunti lineari	φ30
							Mt.	35	Tube	φ50
N.	1	Nastro vulcanizzante								
3		24/05/22	Omissis	Via F.Rosse	Progetto Led	24/05/22	Sost.	2	Lampada a Led	35W
4		24/05/22	Omissis	Vicino Scuola E.Maiorana e Vicino Chiesa S.Sebastiano	Installazione coperchio cemento	24/05/22	N.	2	Installazione coperchio cemento	40x40 cm

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Prot.n. 216	22/04/22	Omissis	Via Fogazzaro n.4	Plafoniera penzolante	22/04/22	Rimozione Plafoniera perforante con cavi messi in sicurezza			
2	Prot.n. 225	30/04/22	Omissis	Via Fontanarossa n.2	Palo illuminazione pubblica caduto	30/04/22	Rimozione Palo illuminazione caduto con cavi elettrici messi in sicurezza			
3	Prot.n.224	29/04/22	Omissis	Piazza tre Porte	Zona al buio	30/04/22	Si è provveduto a mettere in sicurezza la zona con il ripristino del quadro elettrico			
4		03/05/22	Omissis	Villetta Auriga	Impianto idraulico	03/05/22	Si e provveduto al ripristino dell'impianto idraulico Fontana (sistem.Perdita)			
5	Prot.n. 50493	04/05/22	Omissis	Via Catilina n.6-15	Pali Corrosi alla base	05/05/22	Si e provveduto a togliere i pali e mettere il punto luce in sicurezza			
							N.	1	Disco grande flex per ferro	
6	Prot.n.241	05/05/22	Omissis	Via Perseo inters. Via Ambrica	Tombino Divelto	05/05/22	Si e provveduto a mettere in sicurezza la zona con transennamento			
							Mt.	6	rete ad alta visibilità	
							N.	4	Tondini di ferro	
							N.	4	Tappi per tondini	
7	Prot.n.246	07/05/22	Omissis	Via Settefarine	Zona al buio	07/05/22	Ripristino quadro di illuminazione pubblica			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
8	Prot.n.251	10/05/22	Omissis	Via Lungomare, Via Mozart, Via Settefarine, Via Ghirlandaio, Via A. del Sarto, Via Fioravantie e Via F. Liszt	Zona al buio	10/05/22	Fase scollegata , ripristino impianto e chiusura quadro elettrico			
	Prot.n.255	10/05/22								
9		13/05/22	Omissis	Via Appia incrocio Via Portuense e Via Verga n.106-92	Buca e Transennamento	13/05/22	Si e provveduto a mettere i due siti in sicurezza con transennamento e con Bitume a freddo			
							N.	1	Sacchi di Bitume	
							Mt.	6	rete ad alta visibilità	
							N.	4	Tondini	
N.	4	Tappi per tondini								
10	Prot.n.269	13/05/22	Omissis	Via Moscato n.19	Buca pericolosa	13/05/22	Si e provveduto a mettere in sicurezza la zona con transennamento			
							Mt.	6	rete ad alta visibilità	
							N.	4	Tondini di ferro	
							N.	4	Tappi per tondini	
11	Prot.n.266	13/05/22	Omissis	Piazza tre Porte	Zona al buio	13/05/22	Ripristino Impianto			
12	Prot.n.273	14/05/22	Omissis	Piazza tre Porte	Zona al buio	14/05/22	Si e provveduto al ripristino impianto d'illuminazione e sistemazione portella quadro			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
13	Prot.n.285	18/05/22	Omissis	Piazza tre Porte	Zona al buio	18/05/22	Da sopralluogo si riscontra quadro elettrico aperto con interruttore generale staccato. Si è provveduto al ripristino dello stesso			
14		27/05/22	Omissis	Via Liszt	Zona al buio	27/05/22	Sezionato impianto, staccata fase in corto e ripristino impianto			
15		27/05/22	Omissis	Via Frazzetto n.17	Progetto Led	27/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
16		27/05/22	Omissis	Largo Cadore e strade adiacenti	Progetto Led	27/05/22	Sost.	5	Armatura stradale Led	50W
17	Prot.n.306	29/05/22	Omissis	Via degli Ulivi e strade adiacenti	Zona al buio	29/05/22	Sezionato impianto, staccata fase in corto e ripristino impianto			
18		30/05/22	Omissis	Via Tevere	Progetto Led	30/05/22	N.	2	Plafoniera a Led	30W
							Mt.	1,5	Cavo Bianco	2x0,75 mmq
19		30/05/22	Omissis	Via Trieste	Progetto Led	30/05/22	N.	3	Plafoniera a Led	30W
							Mt.	2	Cavo Bianco	2x0,75 mmq
20		30/05/22	Omissis	P.zza Martiri della Libertà	Progetto Led	30/05/22	N.	3	Plafoniera a Led	30W
							Mt.	2	Cavo Bianco	2x0,75 mmq
21		30/05/22	Omissis	Via Leoncavallo n.84	Progetto Led	30/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
22	Prot.n.314	30/05/22	Omissis	Via Ventura n.5	Tombino pericoloso	30/05/22	Si è provveduto a mettere in sicurezza la zona con transennamento			
							Mt.	5	rete alta visibilità	
							N.	5	Tondini di ferro	
							N.	4	Tappi per tondini	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
23	Prot.n.318	31/05/22	Omissis	Via Lisia n.91	Buca pericolosa	31/05/22	Da sopralluogo effettuato si riscontra che la buca (vicino pozzetto fognario) si e provveduto ad aggiustarlo			
24	Prot.n.320	31/05/22	Omissis	Corso Salvatore Aldisio dal Cimitero a San Giacomo	Illuminazione pubblica spenta	31/05/22	Si e provveduto al ripristino impianto e sistemazione portella palo quadro divelta			
25		31/05/22	Omissis	Largo Cadore	Progetto Led	31/05/22	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
26		31/05/22	Omissis	Via Botallo n.2	Progetto Led	31/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
27		31/05/22	Omissis	Via S.Beatrice n.35	Progetto Led	31/05/22	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
28		31/05/22	Omissis	Via Beltrami n.9-17	Progetto Led	31/05/22	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
							N.	2	Adattatore Palo	
							Mt.	5	Cavo fror	3G1,5 mmq
