


**Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
mese di luglio 2020**

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	7
Interventi U.r.p. retroattivi	19
Interventi programmati	49
Interventi in emergenza	13
Interventi in reperibilità	8
Totale interventi	96



Report mese di maggio 2020

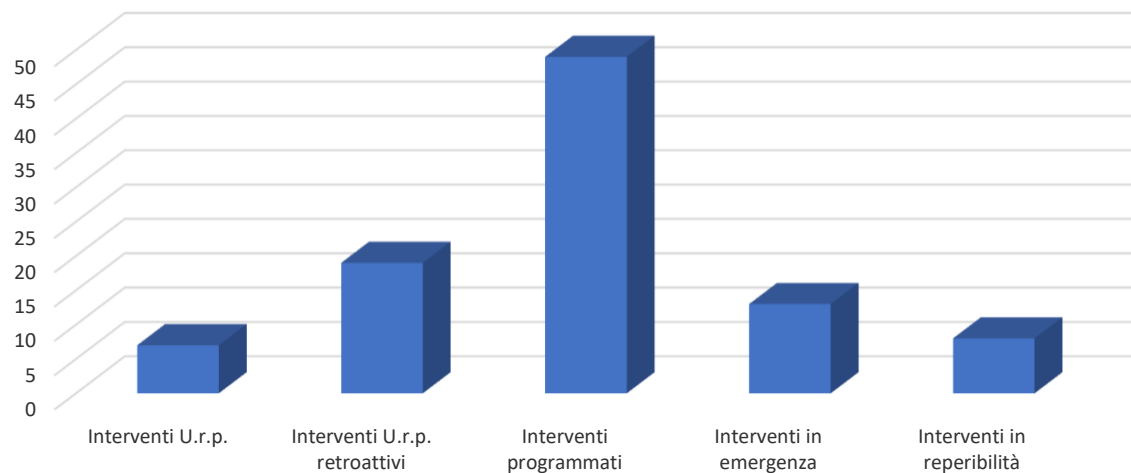

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	70088	06/07/20	Omissis	Via Fleming N.71	Sostituzione lampada	15/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Util.	1	Riduzione	E40 - E27
2	74755	16/07/20	Omissis	Via Parnaso N. 19	Sostituzione lampada	24/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55W
3	74763	16/07/20	Omissis	Via Galeno N. 20	Sostituzione lampada	24/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
4	69567	03/07/20	Omissis	Vico Spada	Sostituzione lampada	24/07/20	Competenza Enel			
5	80528	28/07/20	Omissis	Via Loria N.4	Sostituzione lampada	28/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55W
6	71265	08/07/20	Omissis	Via Monza N.350	Sostituzione lampada	29/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55W
7	80053	27/07/20	Omissis	Via Monza N.310	Sostituzione lampada	29/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Sollecito	15/04/20	Omissis	Via delle Ortensie	Ricollocazione plafoniera	02/07/20	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	4	Fusibile	E40 - E27
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	3	Armature stradali Led	60W
2	Sollecito	15/05/20	Omissis	Via delle Stelle Alpine	Ricollocazione plafoniera	02/07/20	Sost.	4	Fusibile	
							Mt.	30	Cavo fror	3X2.5
							Util.	3	Curve da palo coniche	
							Sost.	3	Armature stradali Led	60W
							Ripristinati giunti bruciati all'interno del pozzeto d'ispezione.			
3	53362	22/05/20	Omissis	Via Bari N.5	Sostituzione lampada	04/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Util.	1	Adattatore	E40 - E27
4	15658	10/02/20	Omissis	Via Barbabianca N.16	Sostituzione lampada	07/07/20	Sost.	1	Fusibile	
5	12631	03/02/20	Omissis	Via Artigiani N.10	Sostituzione lampada	07/07/20	Intervento già eseguito			
6	67533	29/06/20	Omissis	Via Pizzetti N.8	Ricollocazione palo	07/07/20	Intervento già programmato			
7	67936	30/06/20	Omissis	Via G. Mameli N.8	Sostituzione lampada	08/07/20	Intervento già eseguito			
8	57845	04/06/20	Omissis	Via G. Mameli N.8	Sostituzione lampada	08/07/20	Intervento già eseguito			
9	Sollecito	25/05/20	Omissis	Via dei Cedri	Sostituzione lampada	10/07/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Armature stradali Led	60 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
							Sost.	1	Adattatore per armatura	
10	58836	08/06/20	Omissis	Via della Menta	Ricollocazione plafoniera	10/07/20	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	2	Fusibile	
11	Sollecito	15/05/20	Omissis	Via del Riso e Via del Lino	Ricollocazione plafoniera	10/07/20	Sost.	2	Armature stradali Led	60 W
							Sost.	2	Fusibile	
12	67936	30/06/20	Omissis	Via Canaletto N. 6	Sostituzione lampada	10/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
13	67533	29/06/20	Omissis	Via A. Fleming N.71	Sostituzione lampada	15/07/20	Intervento già eseguito			
14	67936	30/06/20	Omissis	Via legnano angolo Via Urbino	Sostituzione lampada	15/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
15	57099	03/06/20	Omissis	Via Fontana N. 74	Sostituzione lampada	23/07/20	Sost.	2	Lampada Led	55 W
16	53362	22/05/20	Omissis	Via Recanati N. 130	Sostituzione lampada	23/07/20	Intervento già eseguito			
17	10964	29/01/20	Omissis	Via Fidia N.112	Sostituzione lampada	24/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Util.	1	Adattatore	E40 - E27
18	24206	02/03/20	Omissis	Via Barbabianca N.16	Sostituzione lampada	28/07/20	Intervento già eseguito			
19	9027	24/01/20	Omissis	Viale E. mattei N.1	Sostituzione lampada	28/07/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Richiesta telefonica	01/07/20	Settore LL.PP.	Via Botallo	Controllo impianto	01/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Riduzione	E40 - E27
2	Richiesta telefonica	01/07/20	Settore LL.PP.	Via Matisse N.21	Controllo impianto	01/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
3	Progetto Led	01/07/20	Ghelas	Via S. M. degli Angeli	Sostituzione armatura stradali	01/07/20	Util.	12	Curve da palo coniche	
							Sost.	12	Armature stradali Led	60W
							Sost.	6	Fusibile	
4	Progetto Led	01/07/20	Ghelas	Via Tamigi - Via Italia	Sostituzione armatura stradali	01/07/20	Sost.	3	Armature stradali Led	60W
5	Progetto Led	01/07/20	Ghelas	Via Parioli	Sostituzione armatura stradali	01/07/20	Sost.	6	Globi	
							Sost.	6	Staffe	
							Sost.	6	Lampada Led	35 W
6	Progetto Led	02/07/20	Ghelas	Via Toscanini	Sostituzione armatura stradali	02/07/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	15	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							Util.	1	Morsetti bifilari	
							Util.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							Util.	1	Capicorda	
Util.	1	Curve da palo coniche								

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
7	Progetto Led	02/07/20	Ghelas	Via del Ginepro	Sostituzione armatura stradali	02/07/20	Sost.	3	Armature stradali Led	60W
							Sost.	3	Fusibile	
8	Progetto Led	02/07/20	Ghelas	Via degli Ulivi	Sostituzione armatura stradali	02/07/20	Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							Util.	1	Curve da palo coniche	
9	Progetto Led	02/07/20	Ghelas	Via ZandonaiN.32	Sostituzione armatura stradali	02/07/20	Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Sost.	1	Fusibile	
							Mt.	20	Cavo fror	3G 1.5
							Util.	1	Curve da palo coniche	
							Util.	1	Morsetti bifilari	
							Util.	1	Capicorda	
							Util.	1	Bullone completo di dado	12Ø
Sost.	1	Armature stradali Led	60W							
10	Progetto Led	02/07/20	Ghelas	Via Tamigi - Via Italia Via Francia	Sostituzione armatura stradali	02/07/20	Sost.	6	Armature stradali Led	60W
11	Richiesta telefonica	02/07/20	Settore LL.PP.	Via C. Carrà	Controllo impianto	02/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Sost.	1	Portalampada	E27
12	Richiesta telefonica	02/07/20	Settore LL.PP.	Via Tindari	Controllo impianto	02/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Util.	1	Riduzione	E40 - E27
13		02/07/20	Ghelas	Via delle Ninfee	Controllo impianto	02/07/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14	Progetto Led	02/07/20	Ghelas	Via Federico II di Svevia nei pressi del Lido Eden	Sostituzione armatura stradali	02/07/20	Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Sost.	1	Fusibile	
							Mt.	20	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	125W
							Util.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							Util.	1	Morsetti bifilari	
							Util.	1	Capicorda	
15	Progetto Led	03/07/20	Ghelas	Via de Nittis - Via Tiepolo	Sostituzione armatura stradali	03/07/20	Sost.	4	Portella palo	Grande
							Sost.	4	Conchiglia	Grande
							Sost.	4	Fusibile	
							Mt.	30	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	4	Armature stradali Led	60W
							Util.	4	Morsetti bifilari	
							Util.	4	Capicorda	
							Util.	4	Bullone completo di dado	12Ø
							Util.	4	Curve da palo coniche	
16	Richiesta telefonica	03/07/20	Settore LL.PP.	Via Bellotto N.16	Controllo impianto	03/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55W
							Util.	1	Riduzione	E40 - E27

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
17	Progetto Led	03/07/20	Ghelas	Via Federico II di Svevia nei pressi panineria Do Brasil	Sostituzione armatura stradali	03/07/20	Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	2	Conchiglia	Grande
							Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	2	PortaFusibile	
							Mt.	20	Cavo fror	3G 1.5
							Util.	2	Morsetti bifilari	
							Util.	2	Capicorda	
							Util.	2	Bullone completo di dado	12Ø
							Util.	2	Curve da palo coniche	
							Sost.	1	Armature stradali Led	125W
Sost.	1	Armature stradali Led	80W							
18	Progetto Led	03/07/20	Ghelas	Via Federico II di Svevia nei pressi del Porto rifugio	Impianto nuovo	03/06/20	Util.	4	Armature stradali Led	60W
							Util.	4	Staffe	
							Mt.	200	Cavo	1X6mm
							Util.	100	Fascette pvc	
19	Progetto Led	07/07/20	Ghelas	Via dell'Orzo	Sostituzione armatura stradali	07/07/20	Sost.	3	Armature stradali Led	60 W
20	Progetto Led	07/07/20	Ghelas	Via dei Gladioli	Sostituzione armatura stradali	07/07/20	Sost.	7	Armature stradali Led	60 W
21	Richiesta telefonica	07/07/20	Settore LL.PP.	Via Recanati N.130	Controllo impianto	07/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55W
							Util.	1	Portalampada	E40

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
22	Richiesta telefonica	07/07/20	Settore LL.PP.	Via Madonna dl Carmelo N.20	Controllo impianto	07/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55W
23	Richiesta telefonica	08/07/20	Settore LL.PP.	C/so V. Emanuele vicino Banca Intesa	Controllo impianto	08/07/20	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	70 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Sodio	70 W
							Sost.	3	Accenditore	70x400
24	Progetto Led	08/07/20	Ghelas	Via Federico II di Svevia nei pressi del Porto rifugio	Impianto nuovo	03/06/20	Util.	10	Armature stradali Led	60W
							Util.	2	Adattatore per armature stradali	
							Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	4	Fusibile	
25		08/07/20	Ghelas	Via Mameli	Controllo impianto	08/07/20	Sost.	2	Lampada Led	35W
26		08/07/20	Ghelas	Via B. Croce N. 33	Controllo impianto	08/07/20	Sost.	2	Lampada Led	35W
27	Progetto Led	10/07/20	Ghelas	Via delle Rose	Sostituzione armatura stradali	10/07/20	Sost.	4	Adattatore per armature stradali	
							Sost.	4	Fusibile	
							Sost.	7	Armature stradali Led	60 W
28		15/07/20	Ghelas	Via I. Giuffrida N.110	Controllo impianto	15/07/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
29	Richiesta telefonica	15/07/20	Settore LL.PP.	Via Grosseto N.10	Controllo impianto	15/07/20	Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Portalampada	E40
30		16/07/20	Ghelas	Vico S. Rocco	Controllo impianto	16/07/20	Sost.	1	Plafoniera led	40 W
31	Richiesta telefonica	16/07/20	Settore LL.PP.	Via Mazzini N.151	Controllo impianto	16/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
32	Progetto Led	18/07/20	Ghelas	Via Federico II di Svevia nei pressi del porto rifugio	Sostituzione armatura stradali	18/07/20	Sost.	4	Armature stradali Led	60 W
							Util.	4	Adattatore per armature stradali	
							Util.	100	Fascette pvc	
							Mt.	100	Cavo bidilico	1X6mm
							Util.	1	Rotolo nastri isolante	
33	Progetto Led	15/07/20	Ghelas	Via dell'Acropoli angolo Via Prati	Sostituzione armatura stradali	15/07/20	Sost.	1	Braccio	
							Sost.	1	Plafoniera led	60 W
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Sost.	1	Capicorda	35mm
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
							Util.	2	Bullone completo di dado	12Ø
34	Progetto Led	21/07/20	Ghelas	Via delle Colline	Sostituzione armatura stradali	21/07/20	Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
							Mt.	14	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	2	Armature stradali Led	60 W
							Util.	1	Adattatore per armature stradali	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
35	Progetto Led	21/07/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda	Sostituzione armatura stradali	21/07/20	Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	2	Fusibile	
							Mt.	18	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	2	Armature stradali Led	60 W
							Util.	2	Curve da palo coniche	
							Util.	2	Bullone completo di dado	12Ø
							Util.	12	Prigionieri esagonali	
							Util.	2	Pettini messa a terra	
36		21/07/20	Ghelas	Via Enna	Controllo impianto	21/07/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
37		23/07/20	Ghelas	Piazza V. Veneto	Controllo impianto	23/07/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
38	Progetto Led	23/07/20	Ghelas	Viale E. Mattei angolo Viale Indipendenza	Sostituzione armatura stradali	23/07/20	Sost.	8	Plafoniera led	60 W
39		23/07/20	Ghelas	Viale E. Mattei	Controllo impianto	23/07/20	Sost.	4	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	4	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	4	Accenditore	70x400
							Sost.	4	Fusibile	
40		23/07/20	Ghelas	Via Stendinello	Controllo impianto	23/07/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
41		23/07/20	Ghelas	C/da Rabbito zona AIAS	Controllo impianto	23/07/20	Sost.	5	Chiusini in cemento	35X35
							Sost.	5	Plafoniere led	60 W
							Mt.	40	Cavo budilico	1X6mm
							Sost.	1	Pozzetto in pvc	35X35
							Sost.	2	Chiusini in ghisa	
							Util.	7	Mattoni pressati	
							Util.	1	Sacco di cemento	
42		24/07/20	Settore LL.PP.	C/so V. Emanuele	Controllo impianto	24/07/20	Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	2	Lampada G12	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
43	Progetto Led	24/07/20	Ghelas	Viale E. Mattei	Sostituzione armatura stradali	24/07/20	Sost.	10	Armature stradali Led	60 W
							Mt.	15	Cavo fror	3G 1.5
44	Progetto Led	27/07/20	Ghelas	Viale E. Mattei	Sostituzione armatura stradali	27/07/20	Sost.	7	Armature stradali Led	60 W
							Mt.	10	Cavo fror	3G 1.5
45	Progetto Led	27/07/30	Ghelas	Viale Indipendenza angolo Viale Cortemaggiore	Sostituzione armatura stradali	27/07/20	Sost.	3	Armature stradali Led	60 W
46		28/07/20	Ghelas	Via Torricelli N. 58	Controllo impianto	28/07/20	Util.	1	Portalampada	E40
							Sost.	1	Lampada Led	55W
47		28/07/20	Ghelas	Via Torricelli N. 40	Controllo impianto	28/07/20	Util.	1	Portalampada	E40
							Sost.	1	Lampada Led	55W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
48	Progetto Led	28/07/20	Ghelas	Via Indovina N. 34	Sostituzione armatura stradali	28/07/20	Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	6	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							Util.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							Util.	1	Capicorda	
							Sost.	1	Fusibile	
							Util.	1	Adattatore per armature stradali	
							Util.	1	Pettini messa a terra	
49	Progetto Led	28/07/20	Ghelas	Via Tiepolo	Sostituzione armatura stradali	28/07/20	Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	6	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							Util.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							Util.	1	Capicorda	
							Sost.	1	Fusibile	
							Util.	1	Adattatore per armature stradali	
							Util.	1	Pettini messa a terra	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		02/07/20	Ghelas	Via dei Mirtilli	Zona al buio	02/07/20	Sostituzione cavi bruciati dal contatore all'interruttore nel quadro di Via S.M. degli Angeli prova e ripristino impianto			
							Sost.	1	Accenditore	70x400
2		04/07/20	Ghelas	Vico S. Lucia	Zona al buio	04/07/20	Ripristino fase nel pozzetto d'ispezione			
							Sost.	5	Lampada G12	70 W
							Sost.	1	Reattore	70 W
							Sost.	3	Accenditore	70x400
3		07/07/20	Ghelas	Via Creta	Impianto sempre acceso	07/07/20	Sost.	1	Contattore	63 A
4		08/07/20	Ghelas	Via Niscemi vicino Unieuro	Zona al buio	08/07/20	Ripristino fase nel pozzetto d'ispezione			
							Sost.	3	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
5		08/07/20	Ghelas	Via Settefarine angolo Via Venezia	Controllo semaforo	08/07/20	Sost.	4	Lampada	75 W
6		14/07/20	Ghelas	Borgo Manfria	Controllo pozzetti	14/07/20	Ispezionati i pozzetti per verifica impianto elettrico			
7	287	14/07/20	VV.UU.	Via Borromini N. 1	Palo divolto	14/07/20	Tagliato e rimosso palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza.			
8	290	15/07/20	VV.UU.	Via Minosse Re N.50	Palo divolto	15/07/20	Tagliato e rimosso palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza.			
9		23/07/20	Ghelas	Via Settefarine angolo Via Venezia	Controllo semaforo	23/07/20	Sost.	12	Lampada	75 W
10		24/07/20	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniera	24/07/20	Sost.	1	Plafoniere led	60 W
							Sost.	1	Portella palo	Piccola

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
11	312	28/07/20	VV.UU.	Via Venezia e zona adiacente	Zona al buio	28/07/20	Sost.	1	Timer astronomico	
12	Richiesta telefonica	28/07/20	Settore LL.PP. Arch. Cernigliano	Via Pozzillo angolo Via Crimea	Zona al buio	28/07/20	Mt.	40	Cavo budilico	1X16
							Util.	8	Giunti lineari	25mm
							Controllo e ripristino impianto			
13		28/07/20	Ghelas	Via Gallipoli	Plafoniera penzolante	28/07/20	Riposizionata plafoniera			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	276	07/07/20	VV.UU.	C/so V. Emanuele angolo Via Marconi	Cavi sfiammati	07/07/20	Isolato cavo sfiammato.			
2	Richiesta telefonica	08/07/20	VV.FF di Caltanissetta	Via P. La Rosa	Plafoniera in fiamme	08/07/20	In seguito all'intervento dei VV.FF. che hanno spento le fiamme provenienti da una plafoniera, si è provveduto alla rimozione della stessa e alla messa in sicurezza del punto luce			
							Inst.	1	Timer Astronomico	
3	Richiesta telefonica	11/07/20	Amministratore Ghelas	C/so V. Emanuele zona Chiesa del Rosario	Zona al buio	11/07/20	Controllo e ripristino impianto.			
4	Richiesta telefonica	13/07/20	Amministratore Ghelas	Via Federico II di Svevia vicino pontile	Palo divelto	13/07/20	Tagliato e rimosso palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza.			
5	292	16/07/20	VV.UU.	S.S. 115 per Licata	Palo incidentato N. 171	16/07/20	Tagliato e rimosso palo della pubblica illuminazione incidentato, punto luce messo in sicurezza. Auto coinvolta Lancia Y targa EZ306 NR			
6	295	19/07/20	VV.UU.	Viale Mediterraneo	Palo caduto	19/07/20	In seguito alla caduta di un palo della pubblica illuminazione che ha danneggiato due autovetture posteggiate in Viale Mediterraneo, subito dopo i rilievi della Polizia Municipale e il sopralluogo dei VV.FF. si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo di che trattasi, successivamente sono stati tagliati e rimossi altri due pali che presentavano segni di pericolo caduta.			
7	299	20/07/20	VV.UU.	Via Plutarco - Via Bezelis	Zona al buio	20/07/20	Controllo e ripristino impianto.			
8	308	25/07/20	VV.UU.	Via Pandino	Cavi penzolanti	25/07/20	Ripristinato cavo pensolante in seguito alla caduta di un albero di pino.			
				Via Scontrino	Cavi sfiammati		Ripristino cavi sfiammati nel pozzetto d'ispezione.			
